

Bogø Mølle
Bogø Hovedgade 36

Byggemødereferat

nr : 2

REF.: HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 3

MØDEDATO : 7.1.21 kl.10

DELTAGERE:

AKJ Totalbyg Møllebygger
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

INIT.

MJ
HB
SK

REPR. AF:

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Steen Kronborg
Afb. Hans Erik Albrekt

Bemærkninger til sidste ref.

Ingen

Materiel/mandskab på pladsen

3 mand

Vejrligsdage


1 dag

Byggeriets stade

- Transport fra skov, opskæring og høvling
- Transport + Stillads
- Opsætning af bærende konstruktion
- Montering af dæk
- Montering af rækværk
- Finish

Udført

100%
100%
100%
100%
30%

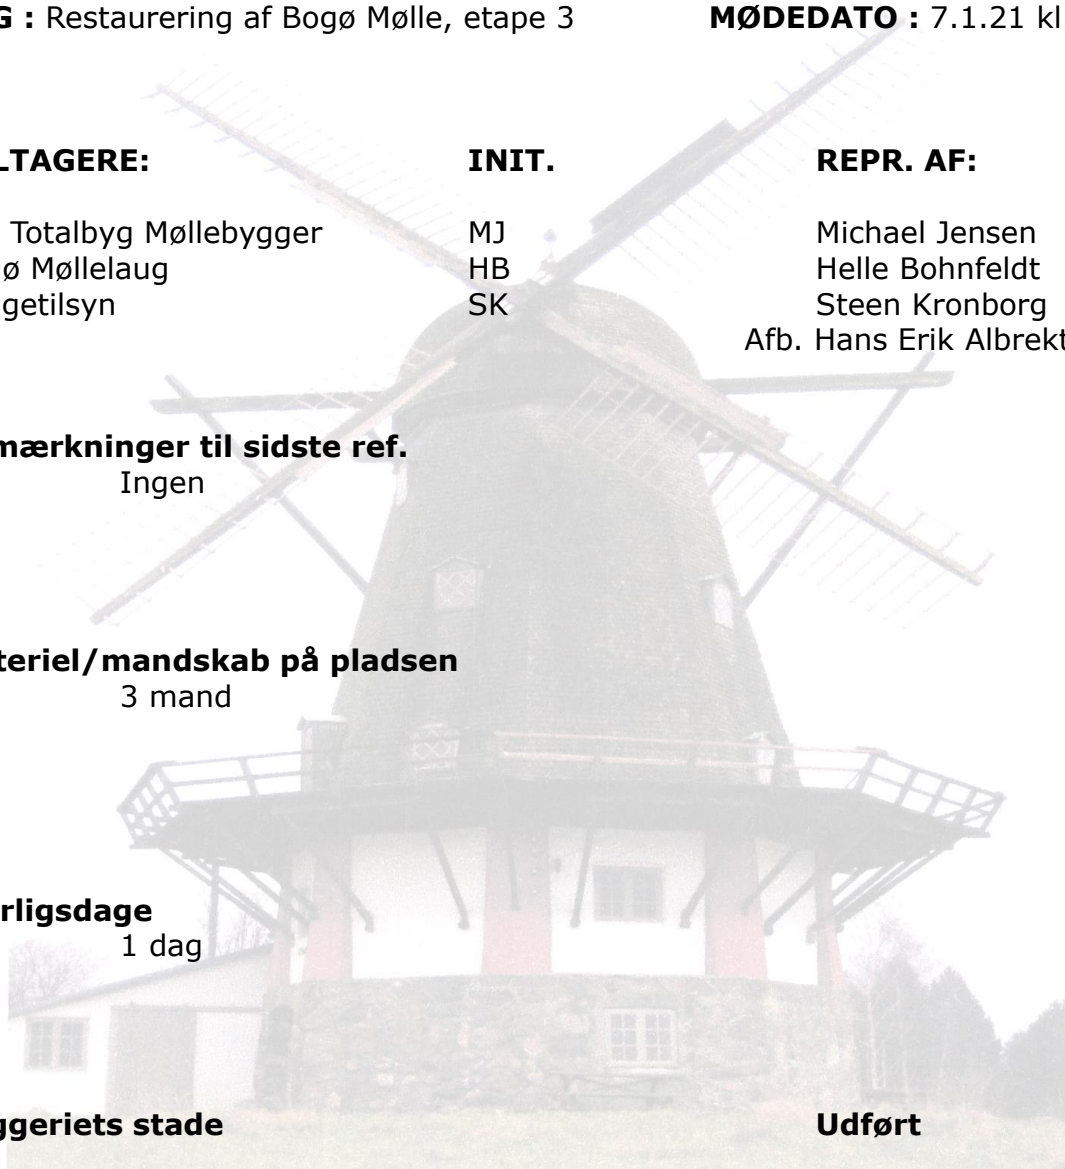

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 6 uger

Start på pladsen 23/11-20

Jul d.19/12 - 20 til 5/1- 21

Forventet afsluttet 15. januar 2021 Michael forventer tidsplanen overholdt.

Evt. kan vejrlig / snestorm forlænge.

Projekt/projektændring

For møllebyggers regning er der udmuret hulrum mellem kampesten i fundamentet mod vest – sydvest med jura mørtel.

Ligeledes er væggen på mellemløftet udbedret.

Det kontrolleres, om der er adgang for alliker i hatten.

Økonomi:

Indkvartering er forlænget 5. til d.16. jan. 2021.

Entrepriseforsikringen forlænget til 16. jan. 2021

Aktiviteter de næste 10 dage:

Færdiggørelse af rækværk og oprydning.

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entrepriseaftale.

Tilsynsnotater:

Afleveringsprotokol Foreløbig fredag d. 15.jan kl. 15.
